SAARISTON PERUSKORJAUKSET 2019

21.10.2019

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

Salkutus lka	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 43	Ennuste €	Toteutuma %	
A	SPi,JEn	4100 8410	Framnäs/WC ja vesikaluste saneeraus					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	10 000 €	0 €	10 000 €	0 %	
			Yhteensä	**10 000 €**	**0 €**	**10 000 €**	0 %	
A	SPi,JEn	4163 8411	Grannas/Peltikaton korjaus+syöksyt					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	30 000 €	0 €	30 000 €	0 %	
			Yhteensä	**30 000 €**	**0 €**	**30 000 €**	0 %	
A	SPi,JEn	4040 8412	Nauvon alakoulu/Eftis Kosteusvauriokorjaus, märkätilaremontti, porrasalus WC-tilat remontti ja lämmityslinjan saneeraus (eftis Simonkylä)					
			suunnittelu	5 000 €	750 €	5 000 €	32 %	Arkkitehtitsto Heimo Paukkunen
			tuntityö	10 000 €	898 €	5 000 €	0 %	Pract Oy, Pargas snickeri
			urakkatyö	75 000 €	21 756 €	64 000 €	19 %	Airiston Putkityö Oy, JF-Service, Arkipelago Oy
			Yhteensä	**90 000 €**	**23 404 €**	**74 000 €**	25 %	
A	SPi,JEn	4041 8413	Nauvon yläkoulu/valaistuksen uusiminen led valoiksi					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	10 000 €	1 538 €	10 000 €	18 %	Ahlsell Oy, Malmberg-Elektro Oy
			Yhteensä	**10 000 €**	**1 538 €**	**10 000 €**	18 %	
A	JJa, Spi	4077 8414	Utön koulu/sähkösaneeraus					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	15 000 €	0 €	15 000 €	0 %	
			Yhteensä	**15 000 €**	**0 €**	**15 000 €**	0 %	
A	JJa, Spi	4132 8415	Houtskarin päiväkoti/Salaojat ja sadevedet suunnittelusaneeraus, patolevyt routaeristys, sorakaista (tulvavaaara) + Muutos: Keittiön vesivahinko					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	20 000 €	43 081 €	65 000 €	81 %	AsBestMen, Saariston Puusepänliike, Tomas Mårtensson, RTC Vahanen Turku Oy,Nurmio&Karlsson Ab,JF-Service,Plåtslageri T Lindström, Pargas snickeri, Huoltoliike Kivinen, Houtskär Boden, M-Market Houtskär
			Yhteensä	**20 000 €**	**43 081 €**	**65 000 €**	81 %	

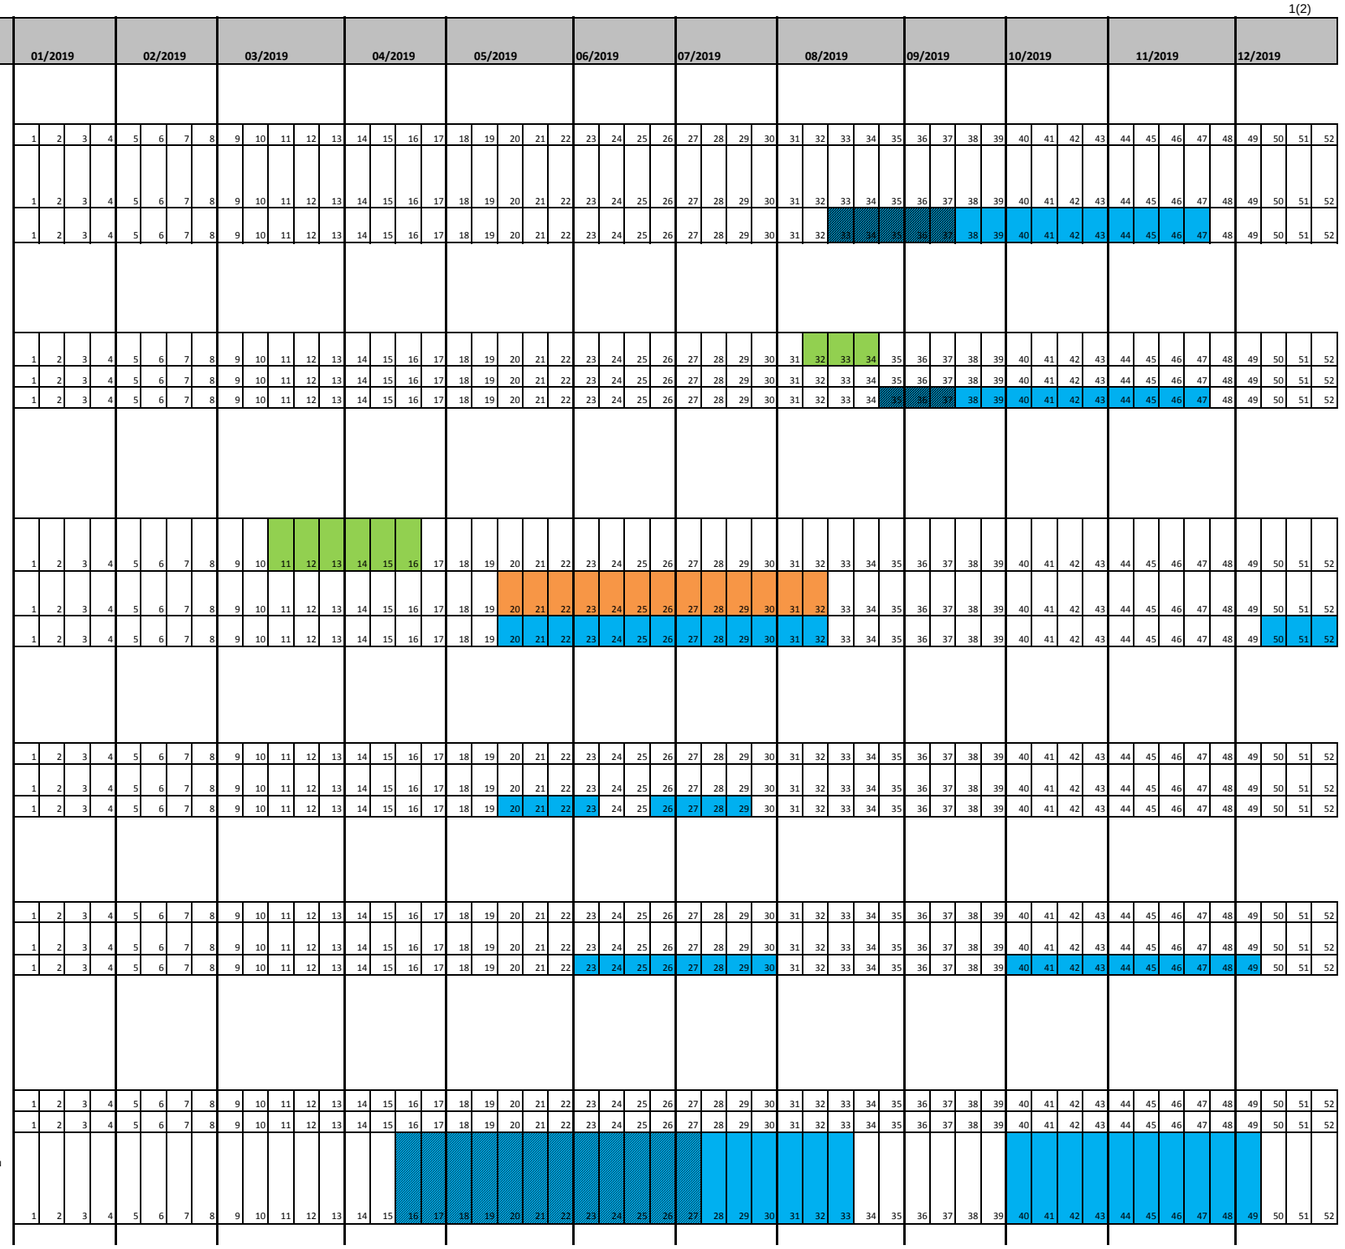

SAARISTON PERUSKORJAUKSET 2019

21.10.2019

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

Salkutus Ika	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 43	Ennuste €	Toteutuma %	
A	Spi, JEn, JJa	4166 8416	Fridhem/sadevesiohjauksia, vesikaton maalaus ja osittain katteen uusiminen, ilmastointijärjestelmän uusiminen ruokasalista asunto-osaan, IV-tekniikka					
			suunnittelu	8 000 €	108 €	8 000 €	84 %	Ilmateam Oy, Kopio Niini Oy
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	77 000 €	76 956 €	77 000 €	82 %	Ahlsell Oy, Ilmatalo Oy, Ilmateam Oy, LVI Eristys K-K Oy, Houtskär El Ab,Mattoliike Sepri Oy, Wurth Oy, Plåtslageri T Lindström,Schneider Electric Finland Oy
			Yhteensä	**85 000 €**	**77 064 €**	**85 000 €**	83 %	
A	SPi, JJa	4153 8417	Iniön terveystalo ja aluetoimisto/ Asunto-osan putkisaneeraus sekä märkätilojen saneeraus					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	20 000 €	0 €	20 000 €	0 %	
			Yhteensä	**20 000 €**	**0 €**	**20 000 €**	0 %	
A	JEn, SPi	4045 8418	Träskin koulu/Tiivistys, rakennekorjaus					
			suunnittelu	2 000 €	21 889 €	25 000 €	3 %	Rakennuttajatoimisto HLC Oy, RTC Vahanen Oy
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	30 000 €	0 €	0 €	0 %	
			Yhteensä	**32 000 €**	**21 889 €**	**25 000 €**	3 %	
A	JJa, SPi, MLu	4164 8419	Regnbågen-Sateenkaari/vesikattokorjaus					
			suunnittelu	0 €	1 585 €	1 600 €	100 %	Asbestmen Oy
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	10 000 €	0 €	8 400 €	100 %	JF-Service, vuotokorjauslasku
			Yhteensä	**10 000 €**	**1 585 €**	**10 000 €**	100 %	
A	SPi, MLu	4044 8420	Saaristomeren koulu/kosteusvaurio- ja rakennekorjaukset					
			suunnittelu	6 000 €	36 282 €	36 300 €	100 %	Rak.inststo Toivonen & Keskitalo, RTC Vahanen Turku Oy, Asbestmen Oy
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	29 000 €	39 372 €	39 400 €	100 %	Sörsas byggeri Ab, Asbestmen Oy,RTC Vahanen, KLV-Palvelu Oy, Airiston Putkityö Oy
			Yhteensä	**35 000 €**	**75 654 €**	**75 700 €**	100 %	
A	SPi,JEn	4046 8421	Iniön koulu/uuden osan välipohjan ja yläpohjan saneeraus					
			suunnittelu	0 €	7 376 €	7 400 €	0 %	Rak.ins.tsto Toivonen&Keskitalo, Grano Oy, ArkkitehtuuristudioSaari, RTC Vahanen, Turun yliopisto
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	35 000 €	57 188 €	58 000 €	99 %	Fix Turku Oy, Kustavin Asentajat, AsBestMen, AC-Elplan, Sähkö-Lukko, Korpo Elservice
			Yhteensä	**35 000 €**	**64 564 €**	**65 400 €**	99 %	
			Kaikki yhteensä	392 000 €	308 779 €	485 100 €	46 %	

Salkutus Ika	Käyttötarkoitus
A	Pidettävät rakennukset
B	Kehitettävät rakennukset
C	Realisoitavat eli myytävät rakennukset
C+	Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos
D	Purettavat rakennukset
