PARGAS KOMMUNOMRÅDE, GRUNDREPARATIONER - PARAISTEN KUNTA-ALUE, PERUSKORJAUKSET 2020

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

11.3.2020

Salkutus lka	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 10	Ennuste €	Toteutuma %	
A	JSa,SPi	4169 8406	Perhetalo Ankaret/ Julkisivun maalaus					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	8 %	
			tuntityö	2 000 €	0 €	2 000 €	0 %	
			urakkatyö	48 000 €	0 €	48 000 €	0 %	
			Yhteensä	**50 000 €**	**0 €**	**50 000 €**	**3 %**	
A	SPi, JSa	4020 8423	Kaupungintalo/ Vesivahinko					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	30 000 €	45 994 €	46 000 €	100 %	Varsinais-Suomen Kiinteistökuvaus,Airiston Putkityö Oy, SMM Capital Oy, Cramo Finland
			Vakuutuskorvaus/arvio	-10 000 €	-24 519 €	-32 000 €		
			Yhteensä	**20 000 €**	**21 475 €**	**14 000 €**	**100 %**	
A	JSa,SPi	4157 8424	Björkebo, pun.talot/A- ja F-talojen liikuntasaumakorjaus					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	5 000 €	0 €	5 000 €	0 %	
			urakkatyö	10 000 €	0 €	10 000 €	0 %	
			Yhteensä	**15 000 €**	**0 €**	**15 000 €**	**0 %**	
A	JSa,SPi	4020 8425	Kaupungintalo/ alakatto ja WC-tilojen kunnostus					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	12 %	
			tuntityö	5 000 €	0 €	5 000 €	0 %	
			urakkatyö	50 000 €	0 €	50 000 €	0 %	
			Yhteensä	**55 000 €**	**0 €**	**55 000 €**	**4 %**	
A	SPi, JSa	4070 8426	Koivuhaan koulu/Keskusradiohuoneen seinien korjaus+ keittiön korjaus					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	40 000 €	0 €	40 000 €	0 %	
			Yhteensä	**40 000 €**	**0 €**	**40 000 €**	**0 %**	
A	JSa,SPi	4071 8427	Nilsbyn koulu/ betoniportaat ja alataso					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	6 000 €	0 €	6 000 €	0 %	
			Yhteensä	**6 000 €**	**0 €**	**6 000 €**	**0 %**	
A	JSa,SPi	4030 8428	Malmin koulu/ Uima-altaan laitteistohuolto ja pihavalaistus					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	7 000 €	6 394 €	7 000 €	63 %	Aqua Nova, Schneider electric, Pargas El
			urakkatyö	8 000 €	0 €	8 000 €	0 %	
			Yhteensä	**15 000 €**	**6 394 €**	**15 000 €**	**32 %**	

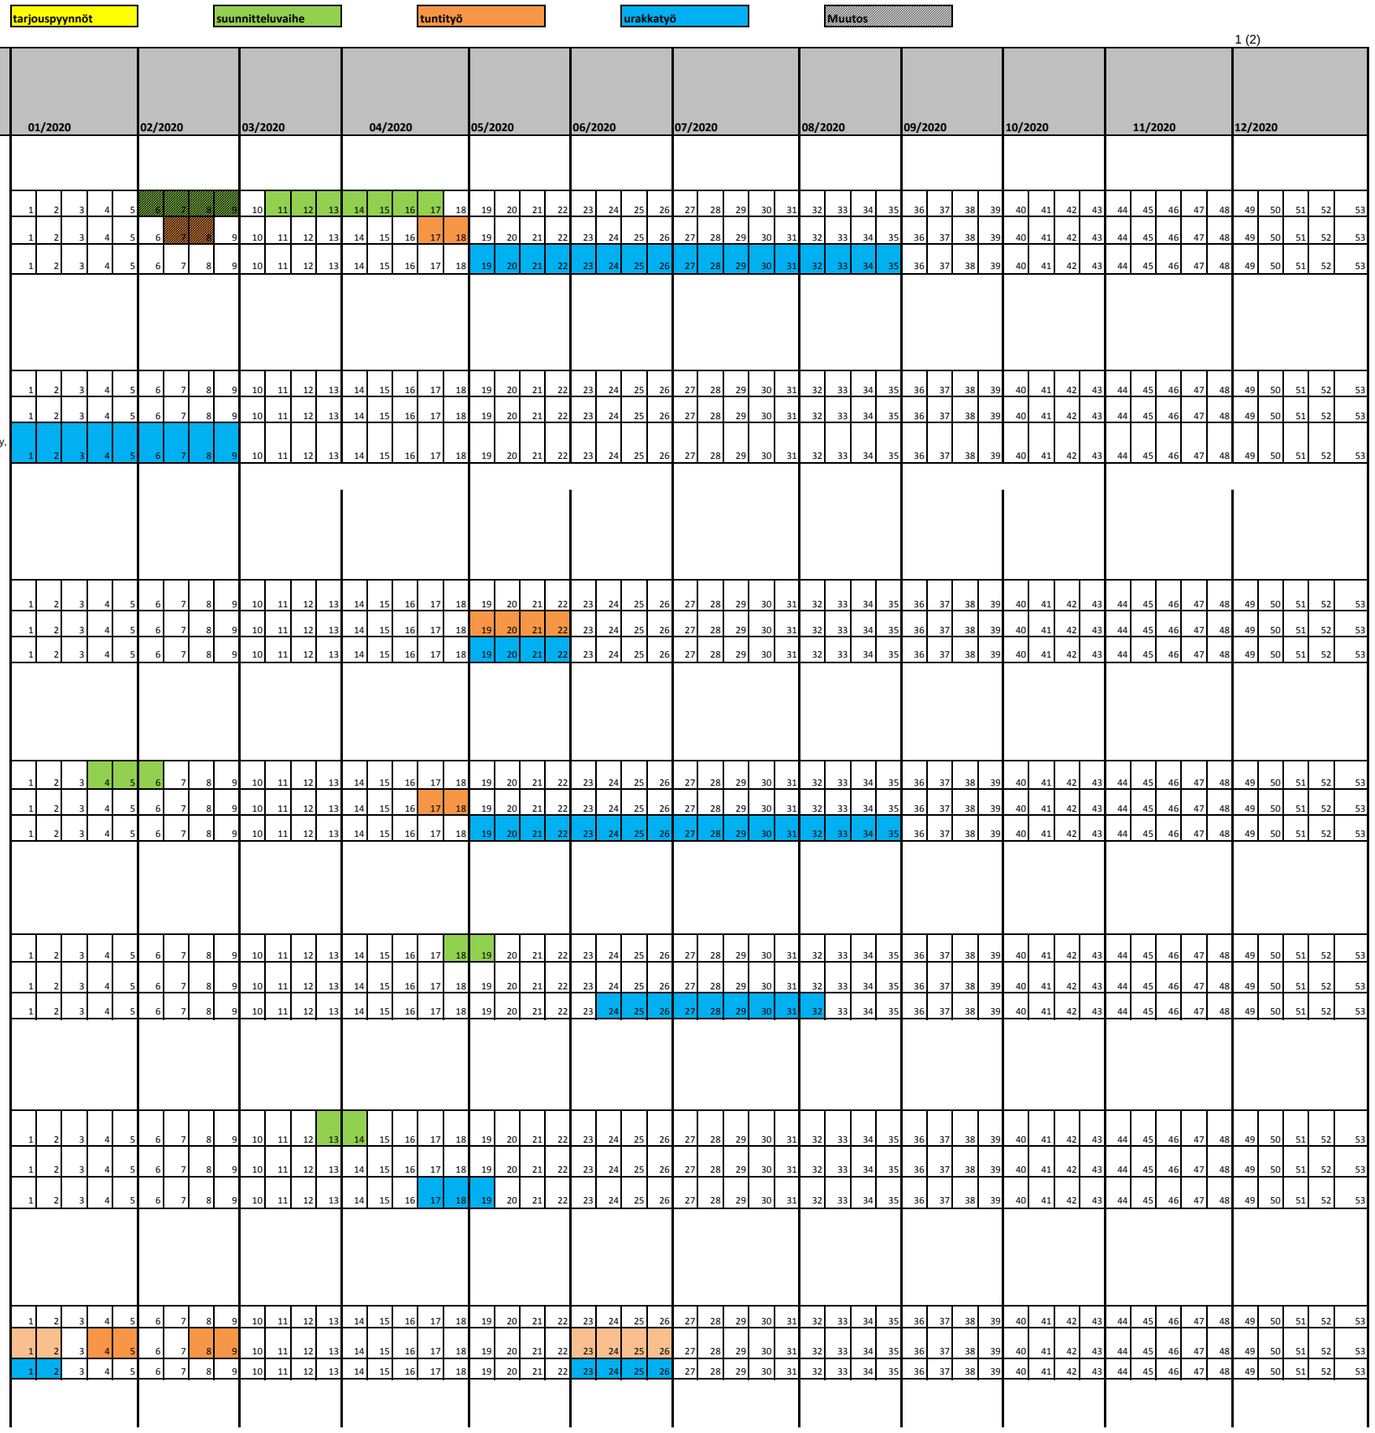

PARGAS KOMMUNOMRÅDE, GRUNDREPARATIONER - PARAISTEN KUNTA-ALUE, PERUSKORJAUKSET 2020

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

11.3.2020

Salkutus Ika	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde		Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 10	Ennuste €	Toteutuma %
A	JSa,SPi	4134 8429	Satuniityn päiväkoti/ Julkisivumaalaus					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	8 %
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %
				urakkatyö	40 000 €	0 €	40 000 €	0 %
			Yhteensä		**40 000 €**	**0 €**	**40 000 €**	**4 %**
A	JSa,SPi	4260 8430	Paraisten paloasema/varavoimakoneen polttoainesäiliön kunnostus					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
				tuntityö	1 000 €	0 €	1 000 €	0 %
				urakkatyö	6 000 €	0 €	6 000 €	0 %
			Yhteensä		**7 000 €**	**0 €**	**7 000 €**	**0 %**
A	JSa,SPi	4170 8431	Folkhälsan uima-allas/Suodatinhiekan vaihto, suihkujen ja saumojen korjaus					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
				tuntityö	10 000 €	0 €	10 000 €	0 %
				urakkatyö	22 000 €	0 €	22 000 €	0 %
			Yhteensä		**32 000 €**	**0 €**	**32 000 €**	**0 %**
A	JSa,SPi	4150 8432	Paraisten terveyskeskus/Sisäänkäyntien saneeraus, sisätilat työterveys					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	19 %
				tuntityö	5 000 €	0 €	5 000 €	0 %
				urakkatyö	15 000 €	0 €	15 000 €	0 %
			Yhteensä		**20 000 €**	**0 €**	**20 000 €**	**6 %**
A	SPi, JSa	4168 8433	Malmkulla/Sisäpihan korjaus, vaihe 1					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
				tuntityö	5 000 €	0 €	5 000 €	0 %
				urakkatyö	30 000 €	0 €	30 000 €	0 %
			Yhteensä		**35 000 €**	**0 €**	**35 000 €**	**0 %**
			Kaikki yhteensä		**335 000 €**	**27 870 €**	**329 000 €**	**16 %** **Kokonaistoteutuma**

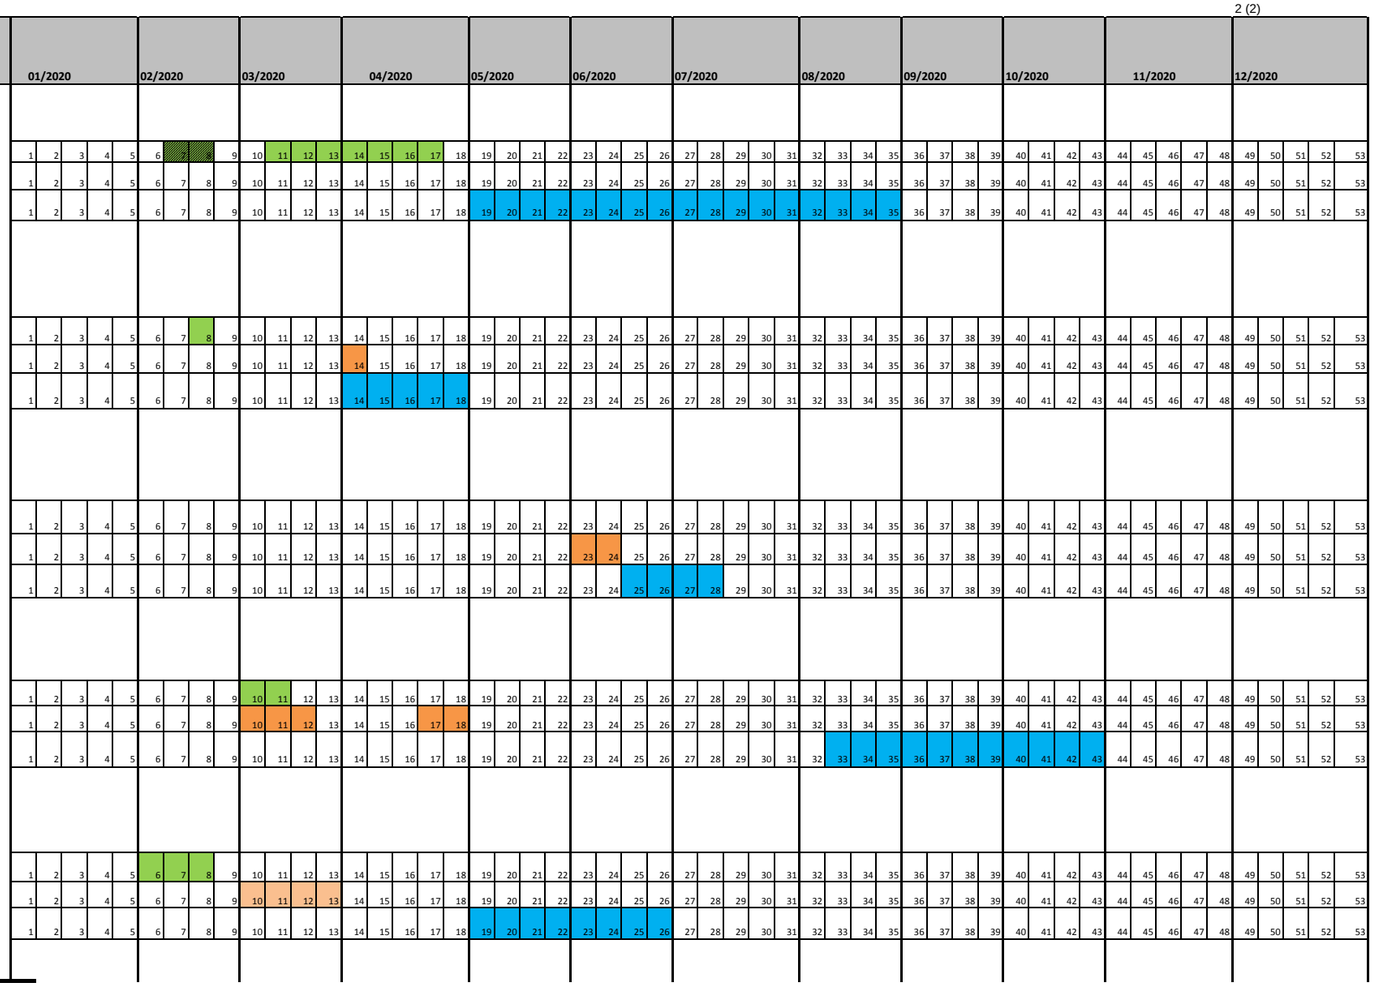

Salkut

Ika	Käyttötarkoitus
A	Pidettävät rakennukset
B	Kehitettävät rakennukset
C	Realisoitavat eli myytävät rakennukset
C+	Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos
D	Purettavat rakennukset
